


Faseringsplan - overzicht

Uitgangspunten faseringsplan:

- Nastreven maximale samenwerking tussen civiele aannemer en nutsaannemer
- Bij voorkeur kort en hevige wegafsluitingen (veilig werken met hoge dagproducties) in plaats van langdurige halve rijbaanafzettingen (onveiliger en lagere dagproducties)
- We houden rekening met de omgeving, ondernemers, evenementen en feestdagen


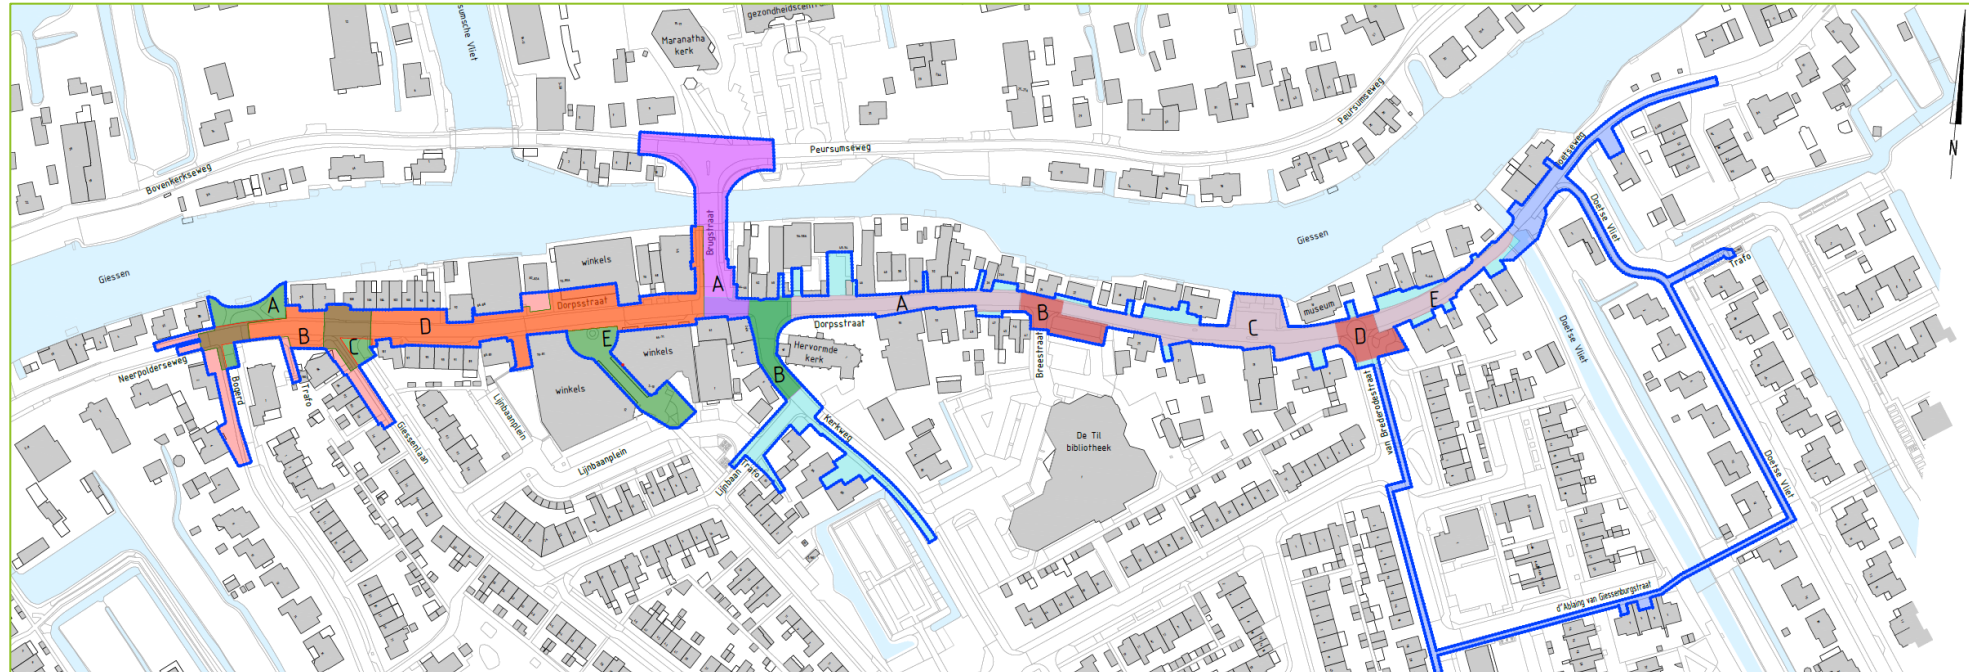


Faseringsplan - fase 1

Fase 1 'Nutswerkzaamheden westzijde tot Brugstraat':

- Aanleg elektrakabels, laagspanning (Stedin)
- Aanleg gasleidingen (Stedin)
- Aanleg OV-kabels (Stedin)
- Aanleg telecom (Stedin)
- Aanleg waterleiding (Oasen)
- Vervangen huisaansluitingen nuts (Oasen en Stedin)

Verkeersmaatregelen: gehele wegafzettingen en omleidingsroutes

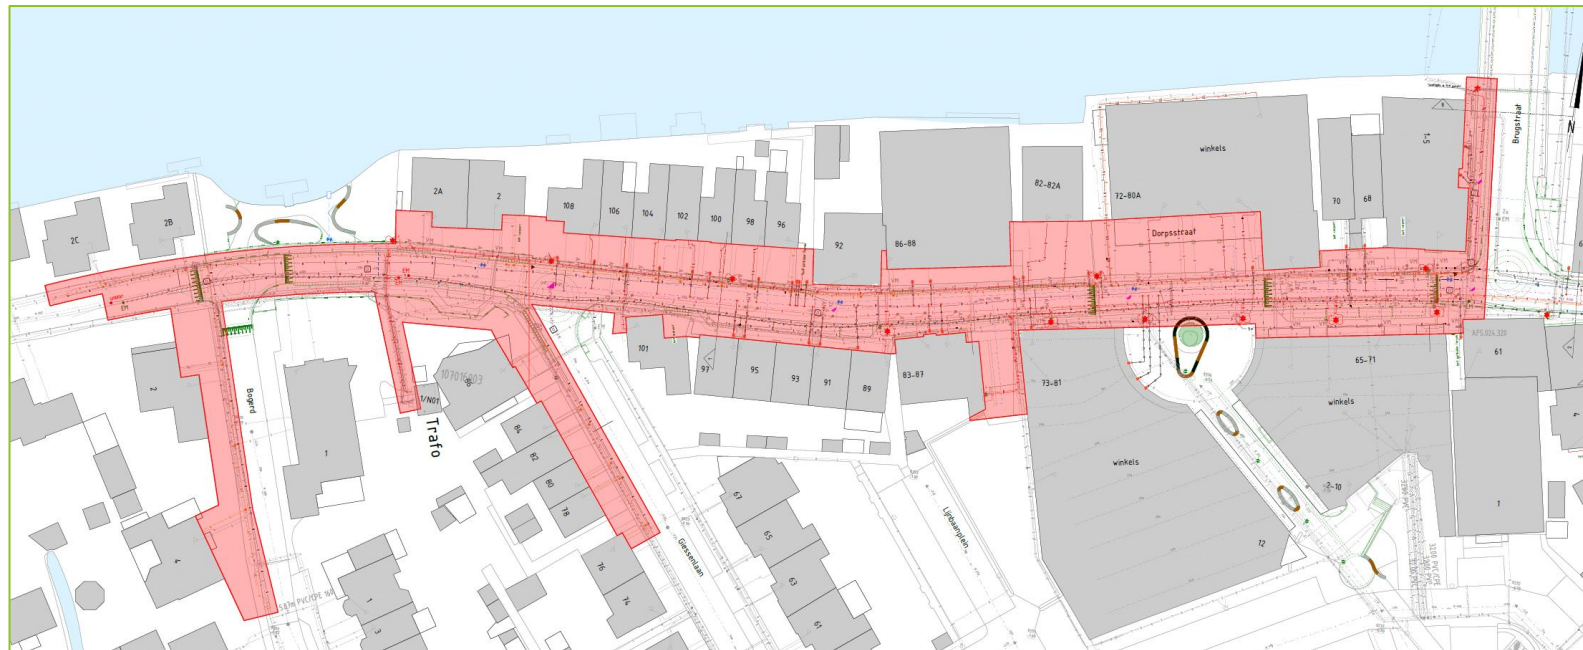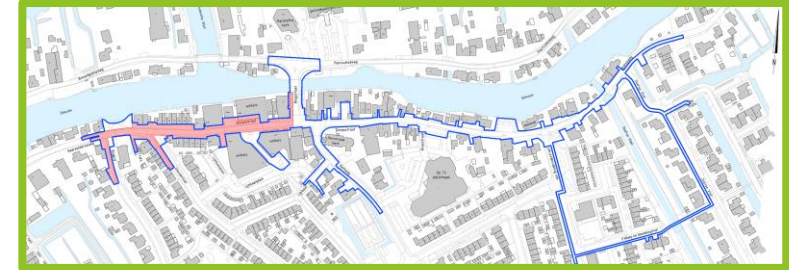


Faseringsplan - fase 2

Fase 2A-2E 'Riolerings- en bestratingswerkzaamheden Dorpsstraat van kruising Bogerd tot kruising Brugstraat':

- Verwijderen buiten bedrijf gestelde kabels en leidingen (3 weken)
- Aanleg gescheiden riool
- Verwijderen bestaand gemengd riool
- Woonrijp maken

Verkeersmaatregelen: gehele wegafzettingen en omleidingsroutes per fase

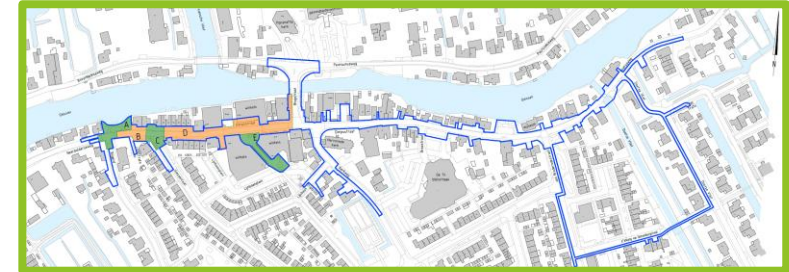


Faseringsplan - fase 3

Fase 3 'Nutswerkzaamheden Brugstraat tot brug over de Doetse Vliet':

- Aanleg elektrakabels, laagspanning (Stedin)
- Aanleg gasleidingen (Stedin)
- Aanleg OV-kabels (Stedin)
- Aanleg telecom (Stedin)
- Aanleg waterleiding (Oasen)
- Vervangen huisaansluitingen nuts (Oasen en Stedin)

Verkeersmaatregelen: gehele wegafzettingen en omleidingsroutes


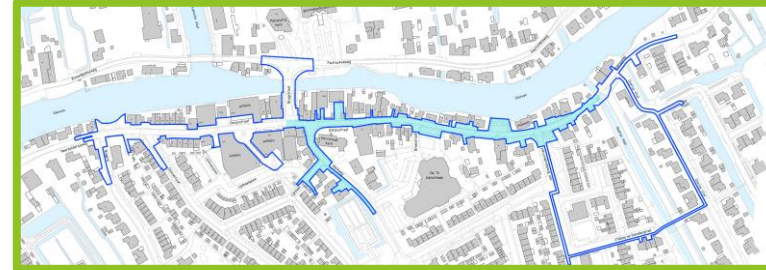


Faseringsplan - fase 4

Fase 4 'Na brug over de Doetse Vliet en zuidzijde inclusief boring':

- Aanleg elektrakabels, middenspanning (Stedin)
- Aanleg elektrakabels, laagspanning (Stedin)
- Aanleg gasleidingen (Stedin)
- Aanleg OV-kabels (Stedin)
- Aanleg telecom (Stedin)
- Aanleg waterleiding (Oasen)
- Vervangen huisaansluitingen nuts (Oasen en Stedin)

Verkeersmaatregelen: halve rijbaanafzetting m.b.v. gefaseerde uitvoering

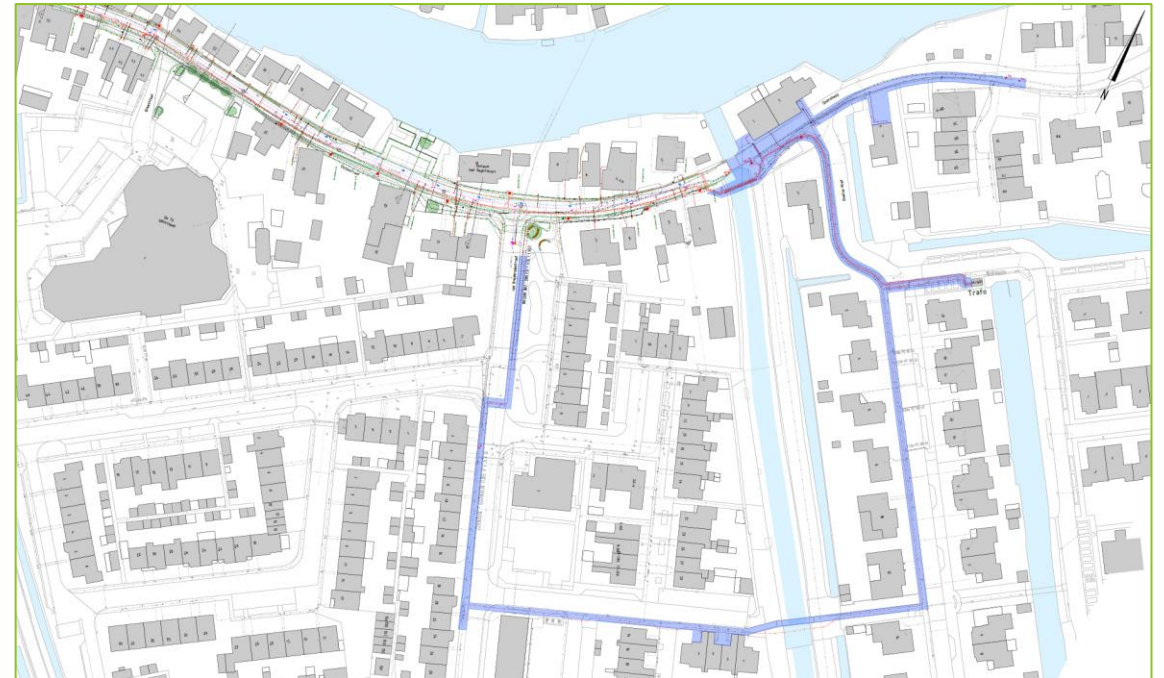
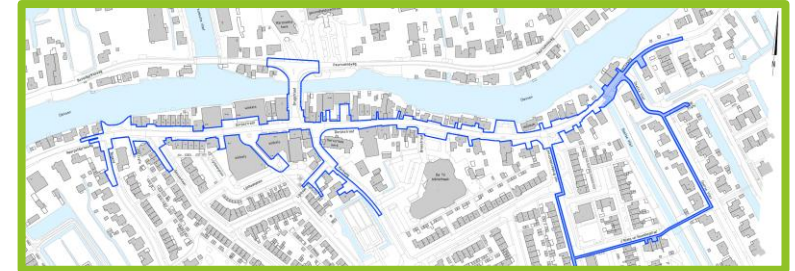


Faseringsplan - fase 5

Fase 5A-5B 'Riolerings- en bestratingswerkzaamheden kruising Brugstraat-Dorpstraat-Peursumseweg en kruising Dorpstraat-Kerkweg':

- Verwijderen buiten bedrijf gestelde kabels en leidingen (1 week)
- Aanleg gescheiden riool
- Verwijderen bestaand gemengd riool
- Woonrijp maken

Verkeersmaatregelen: gehele wegafzettingen en omleidingsroutes per fase

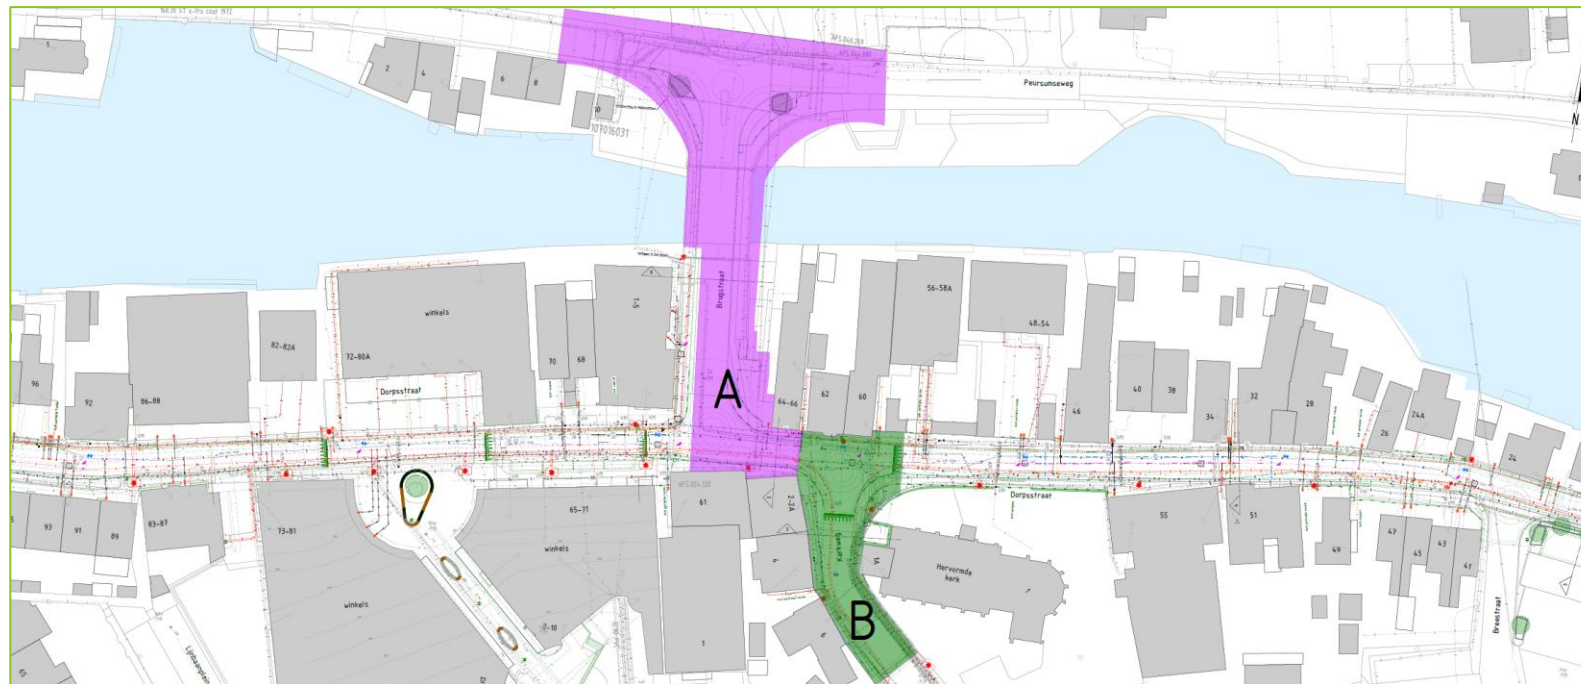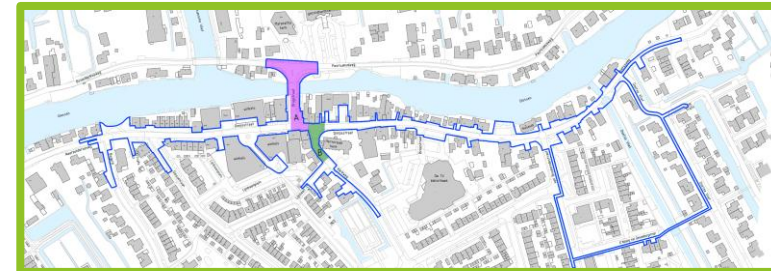

Faseringsplan - fase 6

Fase 6A-6E 'Riolerings- en bestratingswerkzaamheden Dorpsstraat van kruising Brugstraat t/m brug naar Doetseweg':

- Verwijderen buiten bedrijf gestelde kabels en leidingen (3 weken)
- Aanleg gescheiden riool
- Verwijderen bestaand gemengd riool
- Woonrijp maken

Verkeersmaatregelen: gehele wegafzettingen en omleidingsroutes per fase

